


TABLEAUX DE BORD AVANCEMENT DES PROJETS

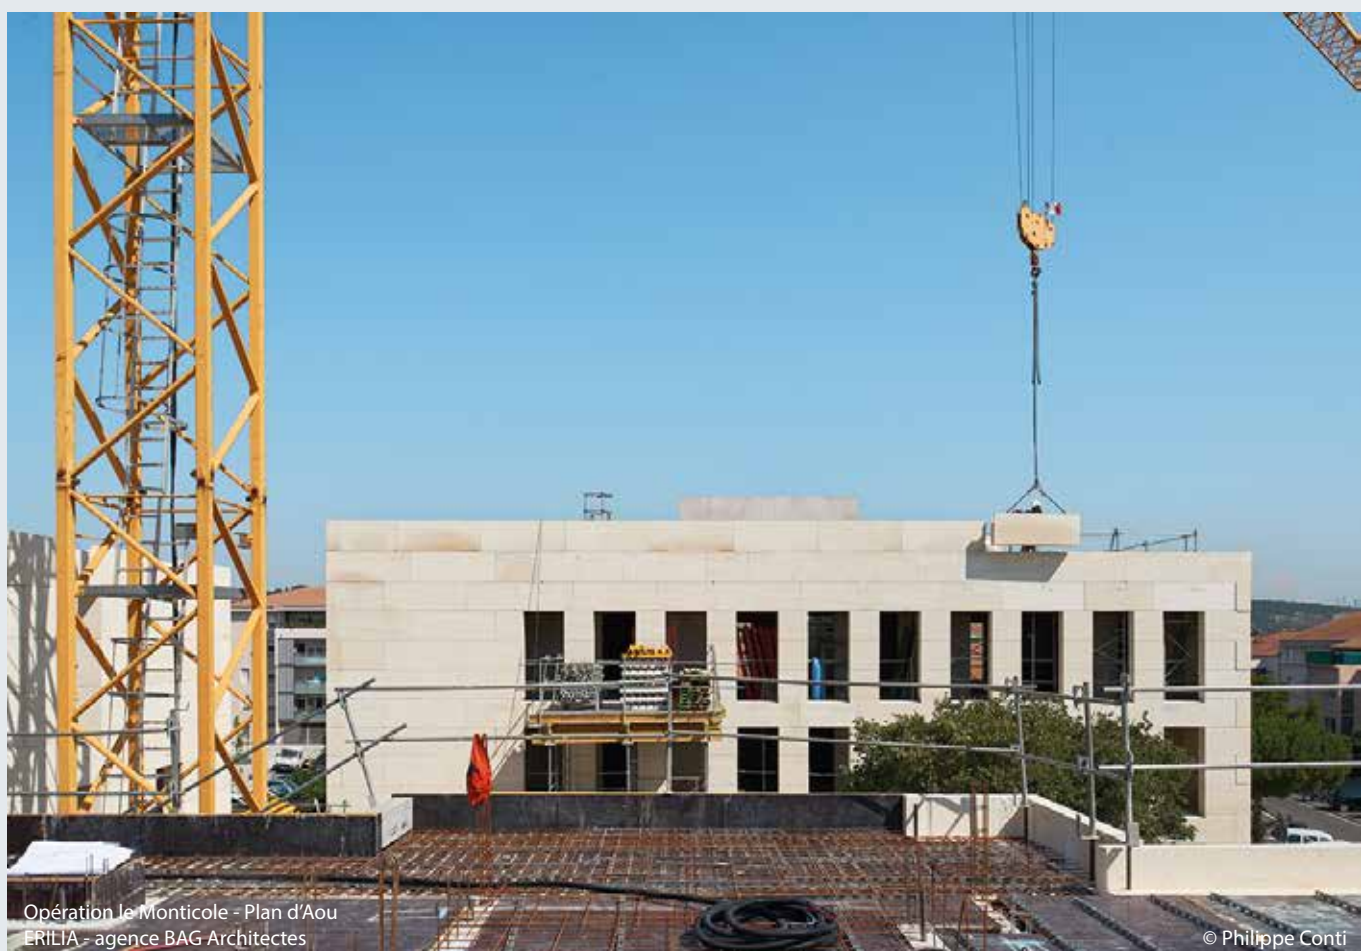

Opération le Monticole - Plan d'Aou
ERILIA - agence BAG Architectes

© Philippe Conti


10/09/2018

AVANCEMENT PHYSIQUE DES PROJETS

10/09/2018

RECONSTITUTION DE L'OFFRE

■ Nombre de logements prévus à la convention ■ Livrés ■ En chantier

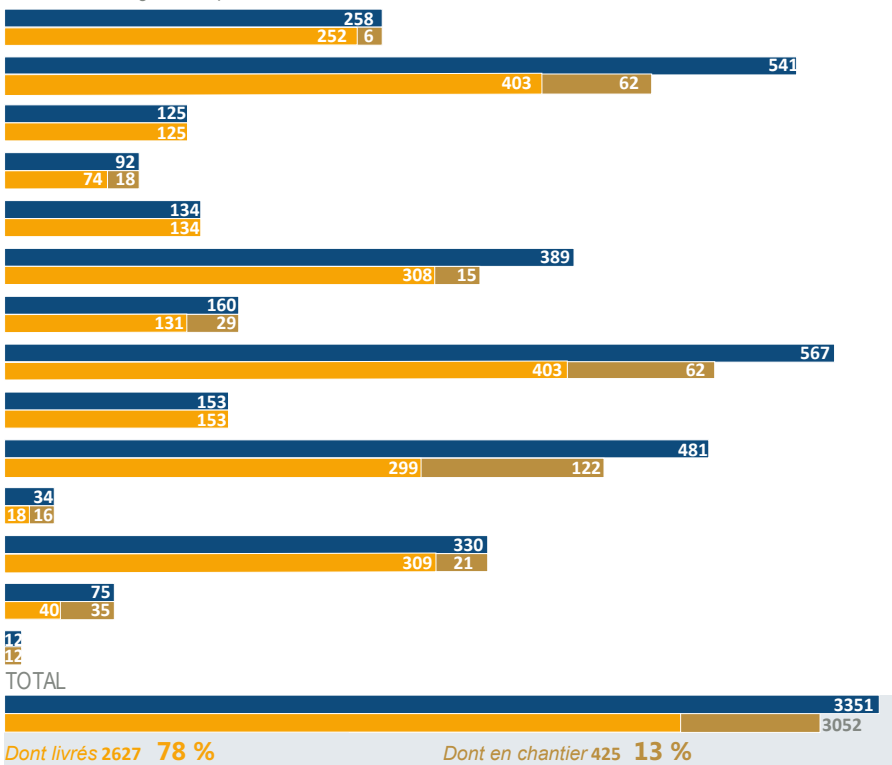


- Plan d'Aou/La Viste
- Flamants/Iris
- Saint Paul
- Saint Joseph
- Les Créneaux
- La Savine
- Saint-Mauront
- Malpassé
- Solidarité
- Centre Nord
- La Soude - Hauts de mazargues
- Saint Barthélémy, Picon Busserine
- Kalliste
- Castellane

91%


Dont livrés 2627 78 %

Dont en chantier 425 13 %



DEMOLITIONS

■ Nombre de logements prévus à la convention ■ Démolis ■ En cours

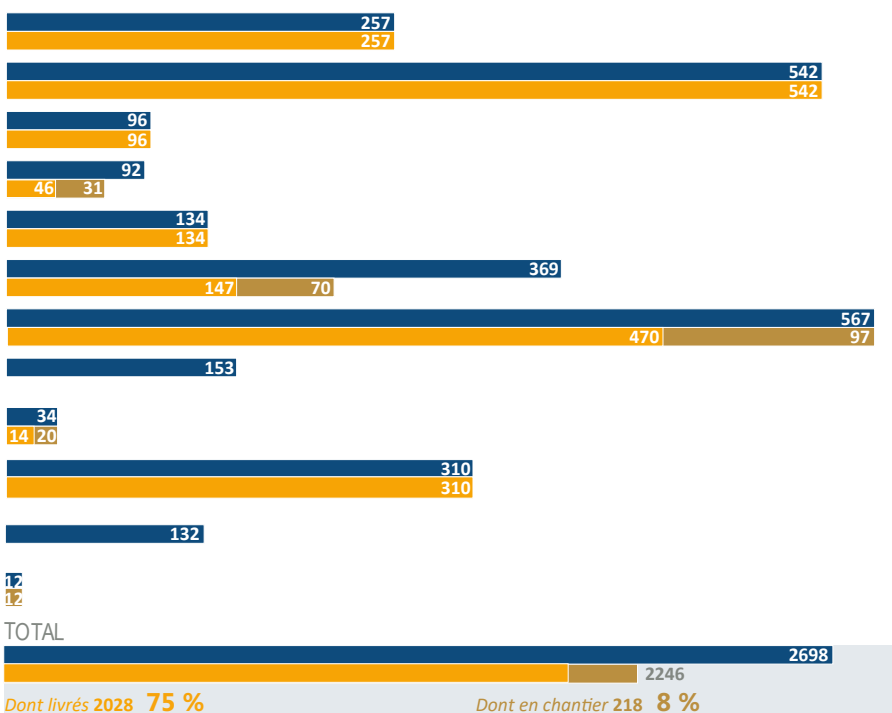


- Plan d'Aou/La Viste
- Flamants/Iris
- Saint Paul
- Saint Joseph
- Les Créneaux
- La Savine
- Malpassé
- Solidarité
- La Soude - Hauts de mazargues
- Saint Barthélémy, Picon Busserine
- Kalliste
- Castellane

83%

Dont livrés 2028 75 %

Dont en chantier 218 8 %




AVANCEMENT PHYSIQUE DES PROJETS

10/09/2018

RELOGEMENTS

■ Nombre de relogements prévus à la convention

■ Réalisés

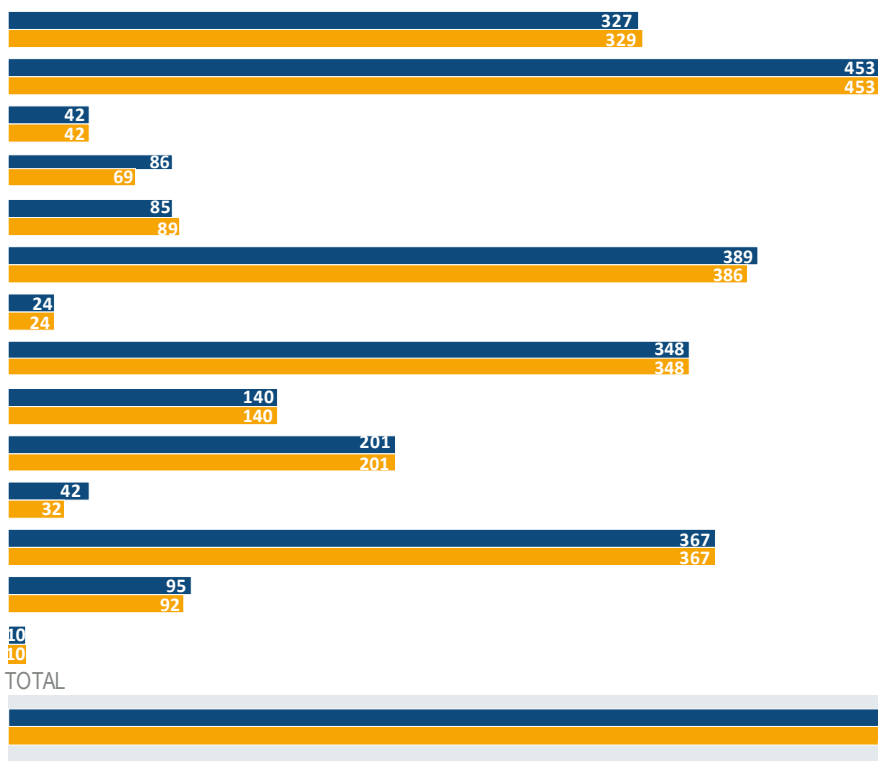

Plan d'Aou/La Viste

Flamants/Iris

Saint Paul

Saint Joseph

Les Créneaux

La Savine

Saint-Mauront

Malpassé

Solidarité

Centre Nord

La Soude - Hauts de mazargues

Saint Barthélémy, Picon Busserine

Kalliste

Castellane


99%

DIVERSIFICATION DE L'OFFRE

■ Nombre logements privés prévus à la convention

■ Livrés

■ En chantier

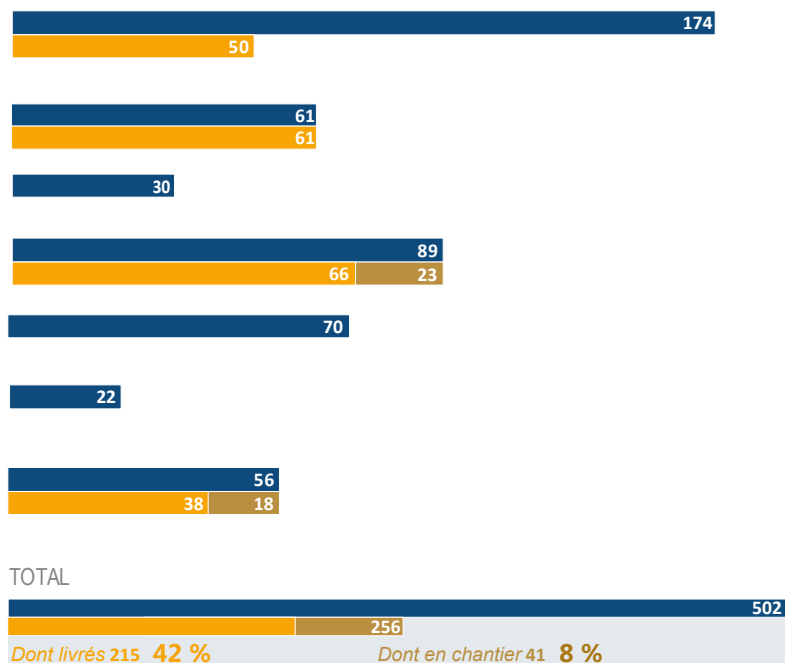

Plan d'Aou/La Viste

Les Créneaux

La Savine

Saint-Mauront

Malpassé

Centre Nord

La Soude - Hauts de mazargues

50%

Dont livrés 215 42 %







Dont en chantier 41 8 %

AVANCEMENT PHYSIQUE DES PROJETS

10/09/2018







REHABILITATIONS

■ Nombre de réhabilitations prévues à la convention ■ Livrés ■ En chantier

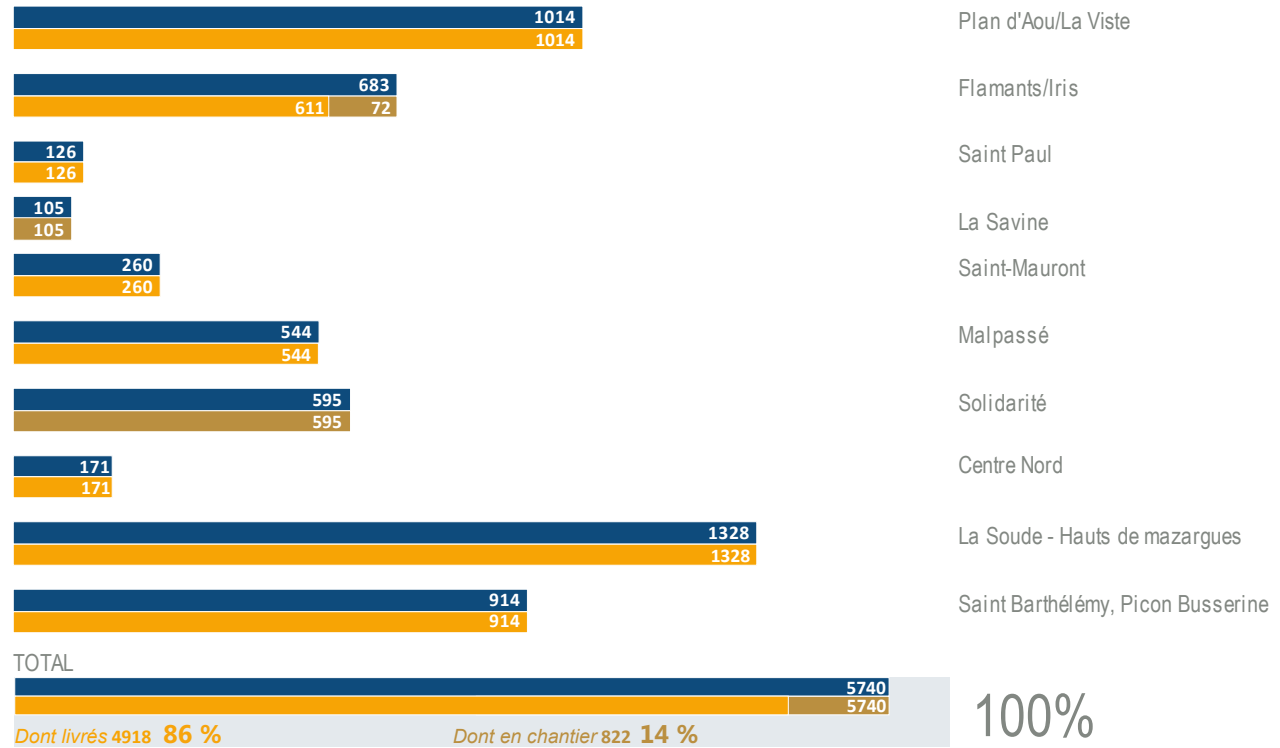

RESIDENTIALISATIONS

■ Nombre de résidentialisations prévues à la convention ■ Livrés ■ En chantier

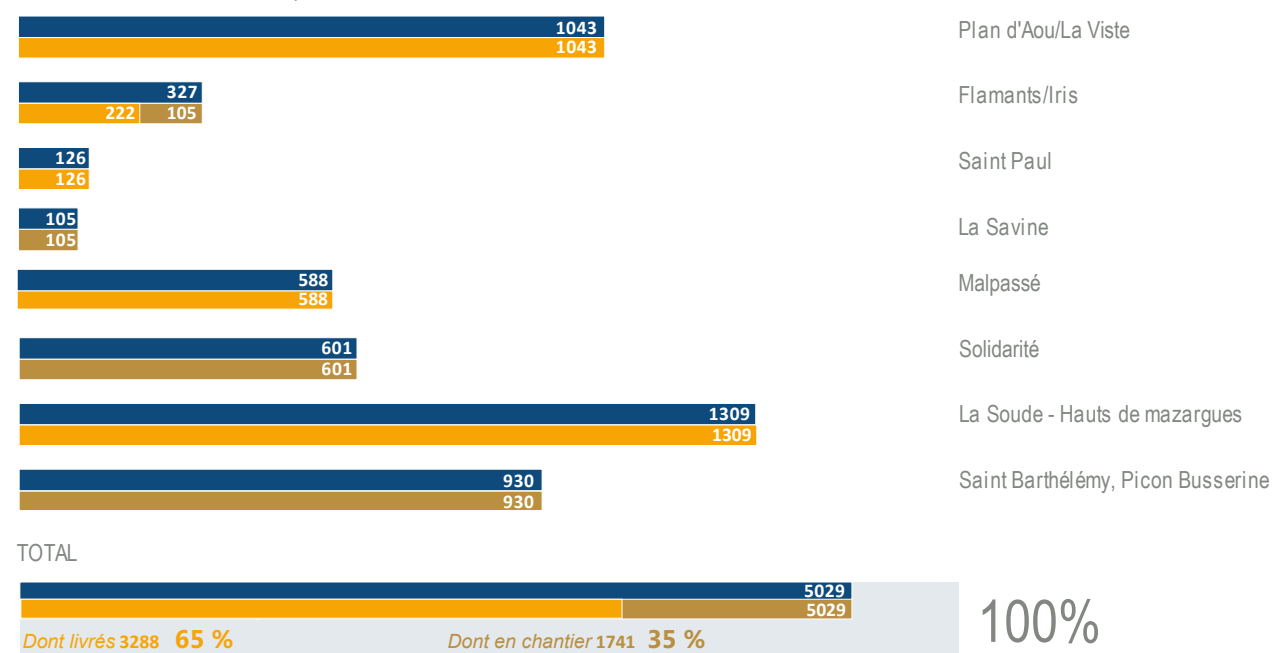


AVANCEMENT PHYSIQUE DES PROJETS

10/09/2018

EQUIPEMENTS

■ TOTAL (en millions d'€ TTC) ■ Réalisés (en millions d'€ TTC) ■ En chantier (en millions d'€ TTC)

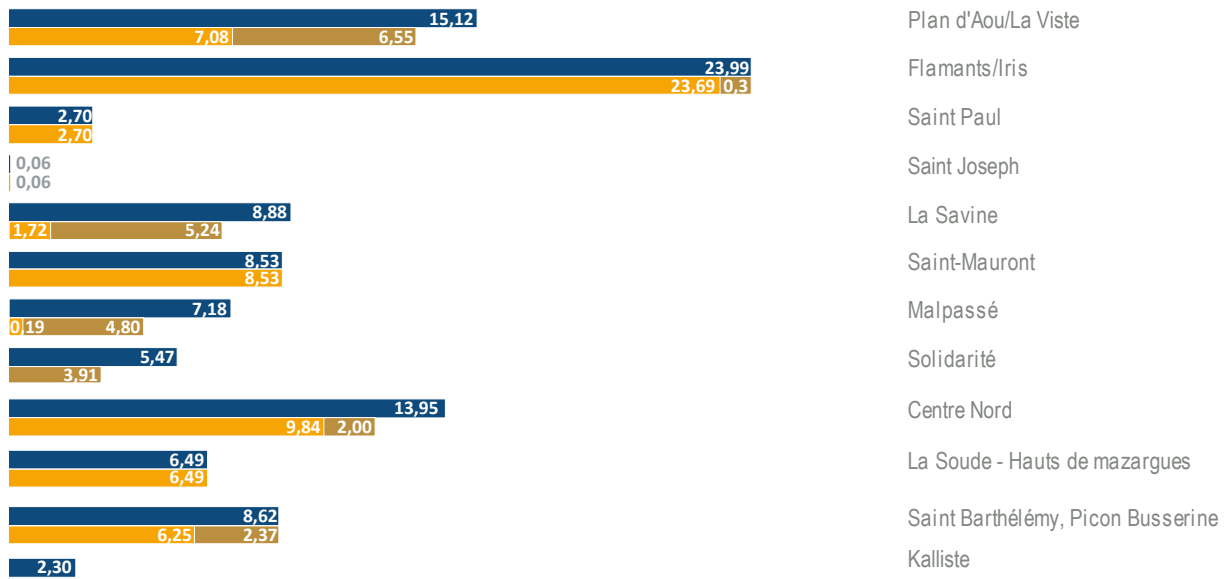


TOTAL



89%

AMENAGEMENTS

■ TOTAL (en millions d'€ TTC) ■ Réalisés (en millions d'€ TTC) ■ En chantier (en millions d'€ TTC)

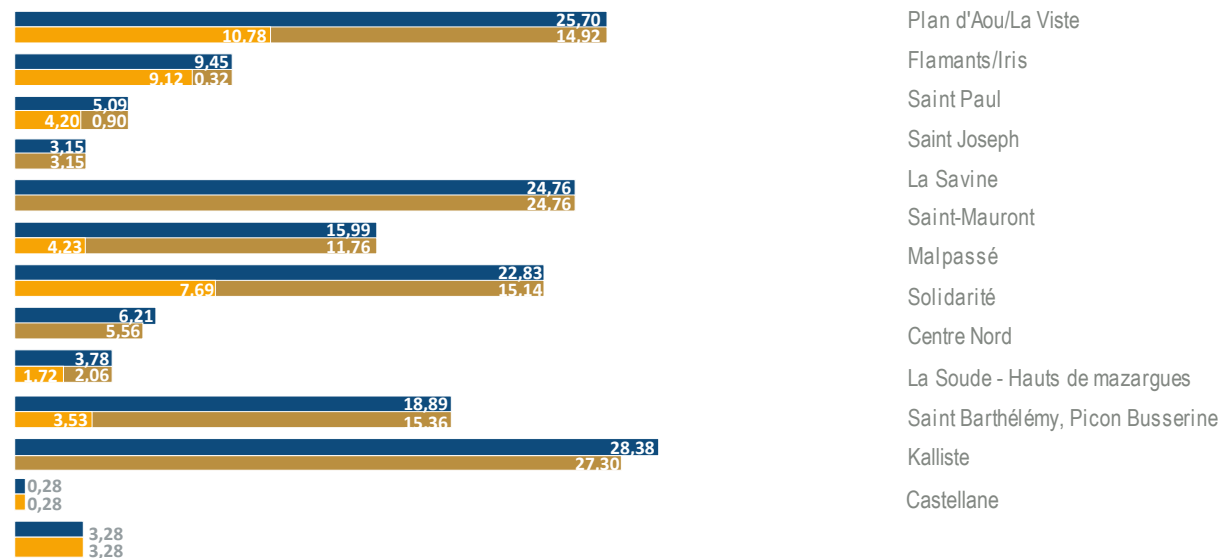

TOTAL



99%
